



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 11. 2014

1. **Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou**
zastoupený: Ing. Tomášem Jirsou, starostou
sídlo: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 00244899
DIČ: CZ00244899
(dále jen objednatel)

a

2. **Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.**
zastoupený: Ing. Miroslavem Ježkem, Miroslavem Ježkem, Petrem Ježkem
sídlo / místo podnikání: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČ: 277 20 161
DIČ: CZ27720161
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se v souladu s článkem XV., odstavcem 1. uzavřené smlouvy dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2014 (dále jen „Smlouva“):

II.

V průběhu provádění stavebních prací při výstavbě Sběrného dvora se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací (bude hrazeno z rezervy)

u stavby „Sběrného dvora“ v objemu 200.975,- Kč bez DPH

Soupis veškerých stavebních víceprací jejichž potřeba byla vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.



III.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních prací při výstavbě Sběrného dvora se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací (dále jen „méněpráce“), které byly obsaženy ve smlouvě naceněném Výkazu výměr, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, smluvní strany se dohodly na neprovedení méněprací

u stavby „Sběrného dvora“ v objemu 7.973,- Kč bez DPH

Soupis veškerých méněprací včetně odůvodnění jejich neprovedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

IV.

V průběhu provádění stavebních prací při výstavbě Sběrného dvora objednatel rozhodl o provedení dodatečných stavebních prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla. Tyto vícepráce nejsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, které budou hrazeny z finančních prostředků objednatele

u stavby „Sběrného dvora“ v objemu 120.650,- Kč bez DPH

Soupis veškerých stavebních víceprací, jejichž potřeba byla vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 4 a č. 5 tohoto dodatku.

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj


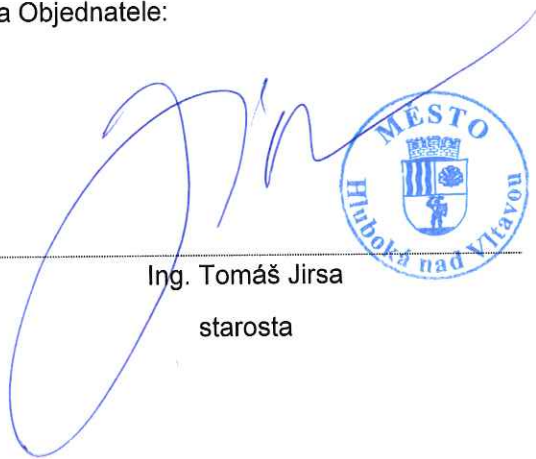
Pro vodu,
vzduch a přírodu

- Přílohy:
- č. 1 – Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – vícepráce (čerpáno z rezervy) – kanalizace splašková – mimo objekt - napojení
 - č. 2 – Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – vícepráce (čerpáno z rezervy) – kanalizace splašková u objektu PMH
 - č. 3 – Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – méněpráce
 - č. 4 - Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – vícepráce - obrubníky
 - č. 4 - Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – vícepráce – dešťová kanalizace

V Hluboké nad Vltavou

Dne 26. 6. 2015

Za Objednatele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta

V Třeboni

Dne 26. 6. 2015

Za Zhotovitele:



HYDRO & KOV s.r.o.
Rybešská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720181, DIČ: CZ27720181

Miroslav Ježek
jednatel společnosti

Název akce: Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – stavba

Změnový list č. 1 – Splašková kanalizace mimo objekt Sběrného dvora - napojení

Zpracovatel změnového listu: Hydro & Kov s.r.o.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

KD č. 2 ze dne 11. 5. 2015

Popis předmětu a příčin změny:

- Zjištění staré stávající kanalizace v trase napojení nové kanalizační přípojky – tento stav bude po úplném odkrytí zdokumentován a bude se postupovat dle požadavků zástupce fa. ČEVAK - posunutí zjištěné staré kanalizace a provedení spadiště. Na základě tohoto zjištění předloží zhotovitel návrh oceněných víceprací

Cenová nabídka zhotovitele:

82.144,- Kč bez DPH

Stanovisko zhotovitele stavby:

Při výkopových pracích k napojení přípojky došlo k zjištění, že v navržené trase je vedeno staré potrubí, které nebylo v žádné PD a ani v evidenci ČEVAK. Při dodržení výšek navržených projektem by došlo ke střetu nového potrubí a potrubí, které nebylo nikde zakresleno. Nutno vyřešit připojení jiným způsobem po dohodě se zástupcem ČEVAK.

Souhlasím, dne

.....

Ing. Ondřej Kubašta

VĚTSEL

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybařská 80
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Stanovisko TDI:

POKRY PIVOŮK

AD: [Signature]

Stavba :	1516 Sběrný dvůr Hluboká	Rozpočet :	1516002
Objekt :	001 Kanalizace splašková (Hydro Kov)	Stavební část - mimo objekt	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	36 776	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 371	0	0	0	0
8 Trubní vedení	11 180	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 062	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	27 440	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 389	27 440	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	79 829	0
Oborová přírážka	0	0,0	79 829	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	79 829	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	79 829	0
Zařízení staveniště	0	2,9	79 829	2 315
Provoz investora	0	0,0	79 829	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	79 829	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	79 829	0
CELKEM VRN				2 315

HYDRD & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třebon 379 01

 IČO: 27720181, DIČ: CZ27720181 2

Název akce: Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – stavba

Změnový list č.2 – Splašková kanalizace sběrný dvůr

Zpracovatel změnového listu: Hydro & Kov s.r.o.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

KD č.3 ze dne 18. 5. 2015

Popis předmětu a příčin změny:

Při výkopových pracích u stávajícího objektu podniku místního hospodářství byla nalezena stará splašková kanalizace. Dle dohody bude tato kanalizace napojena do stávající splaškové kanalizace, která vede v pěší cestě v blízkém okolí SD. Nové vedení a napojení splaškové kanalizace bude zhotovitelem naceněno. (dle PD)

Cenová nabídka zhotovitele:

118.831,- Kč bez DPH

Stanovisko zhotovitele stavby:

Při výkopových pracech zjištěno staré vedení, které nebylo zaznamenáno v PD. Nutno řešit před navážením podkladních vrstev a pokládkou asfaltu, aby nebylo nutné v budoucnu zasakovat do této konstrukce.

Souhlasím, dne

.....

Ing. Ondřej Kubašta

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybařská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 

Stanovisko TDI:

Rozm. Pivovárka

AD: Kuf

Stavba :	1516 Sběrný dvůr Hluboká	Rozpočet :	1516001
Objekt :	001 Kanalizace splašková (Hydro Kov)	Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 796	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 737	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 145	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	71 805	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 678	71 805	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	115 482	0
Oborová přírážka	0	0,0	115 482	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	115 482	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	115 482	0
Zařízení staveniště	0	2,9	115 482	3 349
Provoz investora	0	0,0	115 482	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	115 482	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	115 482	0
CELKEM VRN				3 349

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 701
 Třeboň 379 01
 IČO: 27721161, DIČ: CZ27720161 2

Název akce: Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – stavba

Změnový list č. 3 – oplocení

Zpracovatel změnového listu: Hydro & Kov s.r.o.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Popis předmětu a příčin změny:

- V průběhu výstavby bylo zjištěno, že počet plotových sloupků a vzpěr neodpovídá zaměření v projektové dokumentaci. Bylo zjištěno při realizaci, že stačí umístit menší počet, než bylo uvedeno v rozpočtu. Tudíž byla zhotovitelem vyčíslena méněpráce. To samé se týká i pletiva, které se přichycuje na sloupky.

Cenová nabídka zhotovitele:

-7.973,- Kč bez DPH

Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel s touto změnou souhlasí a provedl osazení a vyčíslení sloupků dle skutečnosti zjištěné na stavbě.

Souhlasím, dne

.....

Ing. Ondřej Kubašta



Stanovisko TDI:

ROSA PIVOŮSKA

AD:

Stavba :	1516 Sběrný dvůr Hluboká	Rozpočet :
Objekt :	SO 05 Oplocení	Oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 SO 05 Oplocení	-7 973	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-7 973	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-7 973	0
Oborová přírážka	0	0,0	-7 973	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-7 973	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-7 973	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-7 973	0
Provoz investora	0	0,0	-7 973	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-7 973	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-7 973	0
CELKEM VRN				0

HYDRO KONTROLA
 Rybnická 89/1
 Třebon 379 01
 IČO: 27721151, DIČ: CZ27720151

Název akce: Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – stavba

Změnový list č.4 – Obrubníky

Zpracovatel změnového listu: Hydro & Kov s.r.o.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

KD č.2 ze dne 15. 6. 2015

Popis předmětu a příčin změny:

- Před pokládkou asfaltové vrstvy zjištěno, že není nikterak řešeno oddělení skladu Sběrného dvora od komunikace. Z důvodu zatýkání pod objekt skladu SD bylo dohodnuto umístění při dlažby, které oddělí sklad od komunikace a zabrání přímému zatékání pod tento objekt. NA KD dohodnuto, že kolem administrativní budovy SD je potřeba osadit obrubníky, které by oddělovali zpevněnou plochu od objektu. PD s tímto nepočítala v nutném rozsahu.

Cenová nabídka zhotovitele:

41 497,- Kč bez DPH

Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel souhlasí s nutností oddělení těchto konstrukcí od zpevněné plochy a zamezení zatékání vody k objektům, aby v budoucnu nedošlo k závadám.

Souhlasím, dne

.....

Ing. Ondřej Kubašta

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybská 80
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Stanovisko TDI: ROSA PIVOÁK

AD: Kubašta

Stavba :	1516 Sběrný dvůr Hluboká	Rozpočet :	1516003
Objekt :	001 Komunikace	Obrubníky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	35 203	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 124	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 327	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	40 327	0
Oborová přírážka	0	0,0	40 327	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	40 327	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	40 327	0
Zařízení staveniště	0	2,9	40 327	1 169
Provoz investora	0	0,0	40 327	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	40 327	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	40 327	0
CELKEM VRN				1 169

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720181, DIČ: CZ27720181

Název akce: Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou – stavba

Změnový list č. 5 – Dešťová kanalizace Sběrný dvůr

Zpracovatel změnového listu: Hydro & Kov s.r.o.

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Popis předmětu a příčin změny:

Při realizaci díla bylo zjištěno, že není řešeno odvedení dešťových vod z objektu SD. Při výkopových pracích dohodnuto řešení tohoto odvodu, aby nemuselo být zasahováno do podkladních a finálních vrstev po dokončení díla Sběrného dvora.

Cenová nabídka zhotovitele:

79 153,- Kč bez DPH

Stanovisko zhotovitele stavby:

Nebylo řešeno v PD. Nutno vyřešit odvod těchto vod od objektu Sběrného dvora.

Souhlasím, dne

.....
Ing. Ondřej Kubašta

Stanovisko TDI:

Rozsah PIVOČEK

AD: *Luft*

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01




IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 7

Hlub

Rozpočet	1516003	Stavební část - Město Hluboká	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
002	Město Hluboká		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1516	Sběrný dvůr Hluboká		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1516
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	36 861	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	40 061	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	76 922	Zařízení staveniště	2 231
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		76 922	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		79 153	Ostatní náklady celkem	2 231
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			79 153 Kč
DPH	21,0 %			16 622 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				95 775 Kč

Poznámka :

Stavba :	1516 Sběrný dvůr Hluboká	Rozpočet :	1516003
Objekt :	002 Město Hluboká	Stavební část - Město Hluboká	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	34 246	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 250	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	365	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	40 061	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 861	40 061	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	76 922	0
Oborová přírážka	0	0,0	76 922	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	76 922	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	76 922	0
Zařízení staveniště	0	2,9	76 922	2 231
Provoz investora	0	0,0	76 922	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	76 922	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	76 922	0
CELKEM VRN				2 231

HYDRO & KUV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

