

### Harmonogram stavby: 14/99 Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice

Zhotovitel : ELESTAV s.r.o.  
Vraclavská 237  
56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí


Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	únor 2015				březen 2015				duben 2015				květen 2015				červen 2015				červenec 2015				srpen 2015
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského	2.2.2015	31.7.2015	2 324 697	561	130	1	6	5	9	10	10	16	18	82	77	61	55	35	21	16	14	19	14	14	14	17	14	12	10	14	1
1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského	2.2.2015	31.7.2015	2 324 697	561	130	1	6	5	9	10	10	16	18	82	77	61	55	35	21	16	14	19	14	14	14	17	14	12	10	14	
2	Topení	2.2.2015	29.5.2015	680 619	16	85	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	2	0	0	0									
1	006: Úpravy povrchu	13.4.2015	1.5.2015	5 848	15	15	1									2	5	7	1													
10	735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	13.4.2015	1.5.2015	89 837	0	15	1									0	0	0	0													
11	784: Malby	18.5.2015	29.5.2015	1 800	0	10	1													0	0											
2	009: Ostatní konstrukce a práce	27.4.2015	1.5.2015	2 720	0	5	1																									
3	713: Izolace tepelné	27.4.2015	8.5.2015	4 780	0	10	1													0	0											
4	722: Vnitřní vodovod	4.5.2015	5.5.2015	4 974	1	2	1													0	0	0										
5	725: Zařizovací předměty	4.5.2015	5.5.2015	290	0	2	1													1												
6	731: Ústřední vytápění - kotelny	4.5.2015	22.5.2015	374 299	0	15	1													0	0	0	0									
7	732: Ústřední vytápění - strojovny	4.5.2015	15.5.2015	56 455	0	10	1													0	0	0	0									
8	733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20.4.2015	8.5.2015	109 290	0	15	1									0	0	0	0	0	0	0	0									
9	734: Ústřední vytápění - armatury	4.5.2015	15.5.2015	30 326	0	10	1													0	0	0	0									
3	Elektroinstalace	2.2.2015	29.5.2015	36 830	12	85	1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	006: Úpravy povrchu	30.3.2015	10.4.2015	4 592	12	10	1									2	7	3														
2	046: Zemní práce pro montážní práce	30.3.2015	10.4.2015	5 437	0	10	1									0	0	0														
3	740: Silnoproud	6.4.2015	29.5.2015	26 801	0	40	1									0	0	0	0	0	0	0	0									
1	stavební	2.2.2015	31.7.2015	1 607 248	534	130	1	6	5	9	10	10	16	18	80	70	57	50	28	19	16	14	19	14	14	14	17	14	12	10	14	
1	001: Zemní práce	9.3.2015	3.4.2015	42 333	0	20	1																									
10	783: Natěry	20.4.2015	1.5.2015	1 643	1	10	1									0	0	0	0													
11	784: Malby	27.4.2015	8.5.2015	2 750	0	10	1													0	0	0										
12	009: Ostatní konstrukce a práce	4.5.2015	8.5.2015	596	2	5	1													0	0											
13	766: Konstrukce truhlářské	9.3.2015	3.4.2015	39 062	0	20	1													1	0											
14	009: Ostatní konstrukce a práce	16.2.2015	31.7.2015	40 958	86	120	1																									
15	021: Silnoproud	4.5.2015	22.5.2015	2 770	0	15	1													0	0	0	0									
16	099: Přesun hmot HSV	16.2.2015	31.7.2015	8	0	120	1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	713: Izolace tepelné	23.3.2015	8.4.2015	173 272	100	13	1																									
18	762: Konstrukce tesařské	9.3.2015	8.5.2015	144 221	20	45	1																									
19	763: Konstrukce montované	16.3.2015	22.4.2015	23 651	0	28	1													2	2	3		2	2							
2	002: Základy	20.4.2015	15.5.2015	24 399	7	20	1													0	0	0	0									
20	767: Konstrukce zámečnické	11.5.2015	29.5.2015	7 565	0	15	1													1	3			2	2	0						
21	783: Natěry	18.5.2015	2.6.2015	8 202	0	12	1																	0	0	0	0	0				
22	001: Zemní práce	6.4.2015	22.4.2015	48 129	81	13	1									10	34	34	5													
23	003: Svislé konstrukce	13.4.2015	14.4.2015	450	1	2	1													1												
24	005: Komunikace	1.6.2015	5.6.2015	13 719	1	5	1																									
25	008: Trubní vedení	9.3.2015	20.3.2015	9 466	3	10	1																	1								
26	009: Ostatní konstrukce a práce	16.3.2015	10.4.2015	21 637	7	20	1																									
27	099: Přesun hmot HSV	2.2.2015	31.7.2015	10 698	39	130	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	006: Úpravy povrchu	30.3.2015	10.7.2015	673 687	49	75	1																									
4	009: Ostatní konstrukce a práce	23.3.2015	17.7.2015	97 682	12	85	1									1	3	3	4	3	3	3	5	3	3	3	4	3	1			
5	099: Přesun hmot HSV	2.2.2015	31.7.2015	30 538	112	130	1	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	6	4	4	4	6	4	4	4	6	4	4	4	6	
6	711: Izolace proti vodě	11.5.2015	22.5.2015	9 753	0	10	1																									
7	713: Izolace tepelné	9.3.2015	3.4.2015	20 953	14	20	1													3	4	5	2									
8	764: Konstrukce klempířské	6.4.2015	10.7.2015	114 372	0	70	1																									
9	767: Konstrukce zámečnické	25.5.2015	3.7.2015	44 745	0	30	1																									
Nh za měsíc								29				126				228				71				59				49				0
Nh za rok																																0

## Harmonogram stavby: 14/99 Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice

Zhotovitel : ELESTAV s.r.o.  
 Vraclavská 237  
 56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac.	Prům. počet	2 015						
								únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského	2.2.2015	31.7.2015	2 324 697	561	130	1	9 392	306 406	691 399	888 297	319 585	109 620	
1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského	2.2.2015	31.7.2015	2 324 697	561	130	1	9 392	306 406	691 399	888 297	319 585	109 620	
2	Topení	2.2.2015	29.5.2015	680 619	16	85	1	0	0	157 692	522 927			
1	006: Úpravy povrchu	13.4.2015	1.5.2015	5 848	15	15	1			5 540	308			
10	735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	13.4.2015	1.5.2015	89 837	0	15	1			85 109	4 728			
11	784: Malby	18.5.2015	29.5.2015	1 800	0	10	1				1 800			
2	009: Ostatní konstrukce a práce	27.4.2015	1.5.2015	2 720	0	5	1			2 176	544			
3	713: Izolace tepelné	27.4.2015	8.5.2015	4 780	0	10	1			1 593	3 187			
4	722: Vnitřní vodovod	4.5.2015	5.5.2015	4 974	1	2	1				4 974			
5	725: Zařizovací předměty	4.5.2015	5.5.2015	290	0	2	1				290			
6	731: Ústřední vytápění - kotelny	4.5.2015	22.5.2015	374 299	0	15	1				374 299			
7	732: Ústřední vytápění - strojovny	4.5.2015	15.5.2015	56 455	0	10	1				56 455			
8	733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20.4.2015	8.5.2015	109 290	0	15	1			63 273	46 017			
9	734: Ústřední vytápění - armatury	4.5.2015	15.5.2015	30 326	0	10	1				30 326			
3	Elektroinstalace	2.2.2015	29.5.2015	36 830	12	85	1	0	1 672	20 766	14 393			
1	006: Úpravy povrchu	30.3.2015	10.4.2015	4 592	12	10	1		765	3 827				
2	046: Zemní práce pro montážní práce	30.3.2015	10.4.2015	5 437	0	10	1		906	4 531				
3	740: Silnoproud	6.4.2015	29.5.2015	26 801	0	40	1			12 408	14 393			
1	stavební	2.2.2015	31.7.2015	1 607 248	534	130	1	9 392	304 734	512 941	350 976	319 585	109 620	
1	001: Zemní práce	9.3.2015	3.4.2015	42 333	0	20	1		37 449	4 885				
10	783: Nátěry	20.4.2015	1.5.2015	1 643	1	10	1			1 506	137			
11	784: Malby	27.4.2015	8.5.2015	2 750	0	10	1			917	1 833			
12	009: Ostatní konstrukce a práce	4.5.2015	8.5.2015	596	2	5	1				596			
13	766: Konstrukce truhlářské	9.3.2015	3.4.2015	39 062	0	20	1		34 555	4 507				
14	009: Ostatní konstrukce a práce	16.2.2015	31.7.2015	40 958	86	120	1	3 208	7 649	7 402	7 649	7 402	7 649	
15	021: Silnoproud	4.5.2015	22.5.2015	2 770	0	15	1				2 770			
16	099: Přesun hmot HSV	16.2.2015	31.7.2015	8	0	120	1	1	2	2	2	2	2	
17	713: Izolace tepelné	23.3.2015	8.4.2015	173 272	100	13	1		91 732	81 540				
18	762: Konstrukce tesařské	9.3.2015	8.5.2015	144 221	20	45	1		54 379	70 929	18 914			
19	763: Konstrukce montované	16.3.2015	22.4.2015	23 651	0	28	1		9 958	13 693				
2	002: Základy	20.4.2015	15.5.2015	24 399	7	20	1			10 323	14 076			
20	767: Konstrukce zámečnické	11.5.2015	29.5.2015	7 565	0	15	1				7 565			
21	783: Nátěry	18.5.2015	2.6.2015	8 202	0	12	1				7 176	1 025		
22	001: Zemní práce	6.4.2015	22.4.2015	48 129	81	13	1			48 129				
23	003: Svislé konstrukce	13.4.2015	14.4.2015	450	1	2	1			450				
24	005: Komunikace	1.6.2015	5.6.2015	13 719	1	5	1					13 719		
25	008: Trubní vedení	9.3.2015	20.3.2015	9 466	3	10	1		9 466					
26	009: Ostatní konstrukce a práce	16.3.2015	10.4.2015	21 637	7	20	1		13 315	8 322				
27	099: Přesun hmot HSV	2.2.2015	31.7.2015	10 698	39	130	1	1 605	1 842	1 783	1 842	1 783	1 842	
3	006: Úpravy povrchu	30.3.2015	10.7.2015	673 687	49	75	1		13 081	196 220	202 760	196 220	65 407	
4	009: Ostatní konstrukce a práce	23.3.2015	17.7.2015	97 682	12	85	1		7 514	25 047	25 882	25 047	14 193	
5	099: Přesun hmot HSV	2.2.2015	31.7.2015	30 528	112	130	1	4 579	5 258	5 088	5 258	5 088	5 258	
6	711: Izolace proti vodě	11.5.2015	22.5.2015	9 753	0	10	1				9 753			
7	713: Izolace tepelné	9.3.2015	3.4.2015	20 953	14	20	1		18 535	2 418				
8	764: Konstrukce klempířské	6.4.2015	10.7.2015	114 372	0	70	1			29 784	36 932	35 741	11 914	
9	767: Konstrukce zámečnické	25.5.2015	3.7.2015	44 745	0	30	1				7 830	33 559	3 356	
	Cena za měsíc							9 392	306 406	691 399	888 297	319 585	109 620	0
	Cena za rok										2 324 697			

## Finanční harmonogram

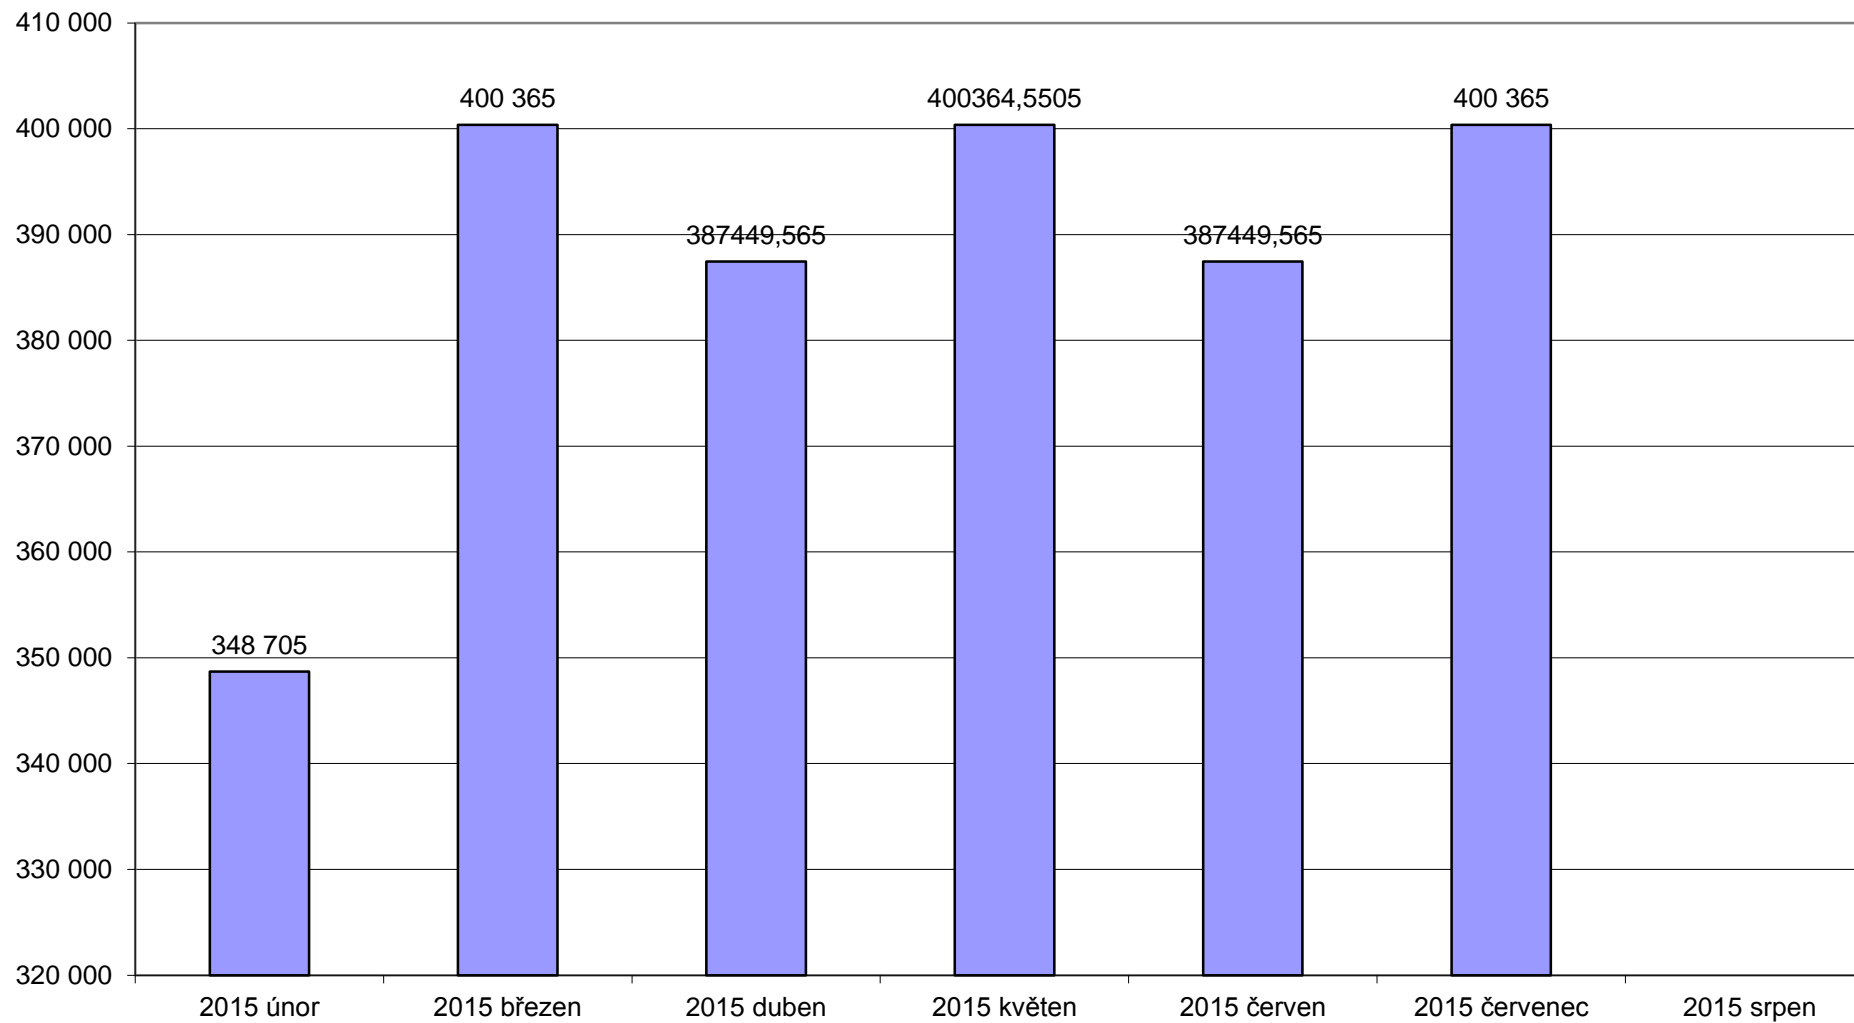

## Součtový finanční harmonogram

