



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

Město Hluboká nad Vltavou

statutární zástupce: starosta města, pan Ing. Tomáš Jirsa

adresa sídla: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Spisová značka: AXI 114 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 00244899

DIČ: CZ00244899

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 2924231/0100

Kontaktní osoba: pan Ing. Petr Smrčka, vedoucí Odboru stavebního a Stavebního úřadu,
tel.: 387 001 338, mobil: 777 328 825, e-mail: smrcka@hluboka.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. **Zhotovitel:**

A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.

se sídlem: Čechova 625/26, 370 04 České Budějovice

spisová značka: C 12514 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 26076748

DIČ: CZ26076748

zastoupený:

Patrikem Pilátem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice, UniCredit Bank Czech

Republic, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 207032616/0300, 32590009/2700

telefon, fax: 386 353 142

e-mail: akupi@akupi.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněním jednat:

za zhotovitele:

Patrik Pilát, jednatel společnosti ve věcech smluvních (tel. 776 134 725)

Ing. Zdeněk Founě, stavbyvedoucí ve věcech technických (tel. 774 134 725)

za objednatele:

Ing. Tomáš Jirsa – ve věcech smluvních

Ing. Petr Smrčka – ve věcech technických (tel.: 387 001 338, mobil: 777 328 825)

technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

PRAVOBŘEŽNÍ VLTAVSKÁ CYKLOSTEZKA ČESKÉ BUDĚJOVICE – HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ÚSEKY J, K, M

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Pravobřežní vltavská cyklostezka Č. Budějovice – Hluboká n./Vlt., část „J,K,L“, „Pravobřežní vltavská cyklostezka Č. Budějovice – Hluboká n./Vlt., část „M“, výkaz výměr, zpracovala: ZESA spol. s r.o., Jírovcova 1620/21, 370 01 České Budějovice

- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 20. 04. 2012.

II.2. Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení díla, vytyčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy vč. geometrického plánu a předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a předložení atestů použitých výrobků a materiálů.

Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 1x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

Geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD).

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré.

II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 5. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno a

předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Případné změny předmětu plnění budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **říjen 2012**
- Dokončení stavebních prací: **leden 2013**
- vyklizení staveniště: do 5 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků nebo zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 7 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

IV.5. Pokud předpokládaný termín zahájení stavebních prací nebude posunut o více jak 15 dnů, pak nemá vliv na termín dokončení stavebních prací. Jinak bude uchazeč mít právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby zůstala zachována, a bude případně podložena změnou smlouvy o dílo uzavřením příslušného dodatku.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Část J, K	2 664 493,91,-- Kč
DIO část J, K	8 053,06,-- Kč
Část M	1 142 363,49,-- Kč
DIO část M	13 690,27,-- Kč
Ostatní náklady (nezahrnuté v objektech, uvedené v čl. II.2 této smlouvy)	10 000,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	3 838 600,72,-- Kč
DPH	767 720,15,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 606 320,87,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1 po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.5. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky a prodlení v jejich provádění je delší o 60 kalendářních dnů.
- Splatnost dílčí faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.7. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.9. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.8. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se

zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.

VII.10. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

VII.11. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VIII. Dodání díla a převímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 10 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. Tyto drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, musí být vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.

VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **36 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5 kalendářních dnů**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.

- X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 1 500,- Kč za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Hluboká nad Vltavou dne 26. 9. 2012


České Budějovice dne 26. 9. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

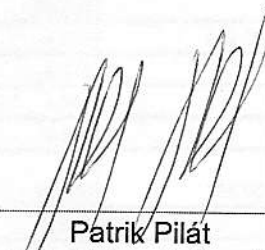

Patrik Pilát

jednatel společnosti
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.

Čečova 625/ 26
370 04 České Budějovice
tel./ fax: 386 353 142
IČ: 260 76 748, DIČ: CZ26076748

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pravobřežní vltavská cyklostezka ČB-Hluboká n.Vlt.

Objekt: Část J, K

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				2 664 493,91
1			Zemní práce				846 631,50
1	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živčního pojiva	m2	565,000	25,00	14 125,00
2	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živčním pojivem	m2	565,000	28,00	15 820,00
			565		565,000		
3	001	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	35,000	65,00	2 275,00
4	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 102,000	75,00	82 650,00
			880+80+107+35		1 102,000		
5	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	551,000	22,00	12 122,00
			1102/2		551,000		
6	469	131215940R	Hloubení nezapažených jam základů sloupků	kus	26,000	340,00	8 840,00
			"základ pro dř. zábradlí" 26		26,000		
7	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,919	432,00	4 285,01
			0,26*0,35*58		5,278		
			0,26*0,35*51		4,641		
			Součet		9,919		
8	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	125,00	8 750,00
			"odvoz na mezideponii a přivezení" 2*35		70,000		
9	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 076,919	245,00	263 845,16
			880+80+107+9.919		1 076,919		
10	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16 153,785	19,50	314 998,81
			1076.919*15		16 153,785		
11	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	35,000	75,00	2 625,00
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 111,919		
			1076.919+35		1 111,919	12,00	13 343,03
13	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 565,000	18,50	102 952,50
			5000+565		5 565,000		
2			Zakládání				2 129,92
14	211	275311123	Základové patky z betonu prostého C 8/10	m3	0,832	2 560,00	2 129,92
			26*0,2*0,2*0,8		0,832		
3			Svislé a kompletní konstrukce				141 000,00
15	211	348181111	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé vč. impregnace	m	50,000	720,00	36 000,00
16	592	592163640R	zábradlí ocelové dl. 2 x 7 m	m	14,000	7 500,00	105 000,00
5			Komunikace				1 000 604,90
17	221	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	4 202,000	29,00	121 858,00
18	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	15,000	80,00	1 200,00
19	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	4 202,000	142,00	596 684,00
20	221	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	200,000	42,00	8 400,00
21	221	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 100 mm	m2	757,000	58,00	43 906,00
			2*180*0,25+2*1334*0,25		757,000		
22	221	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	565,000	19,50	11 017,50
23	221	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	565,000	76,00	42 940,00

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Právobřežní vltavská cyklostezka ČB-Hluboká n.Vlt.

Objekt: Část J, K

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
24	221	573411114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	565,000	42,00	23 730,00
25	221	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	565,000	48,00	27 120,00
26	221	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	565,000	195,00	110 175,00
27	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	15,000	460,00	6 900,00
28	583	583800100	mozaika dlažební, materiálová skupina I/2 4/6 cm	t	1,620	4 120,00	6 674,40
			15*0.06*1.8		1,620		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

527 535,16

29	R	900	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00
30	R	901	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
31	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	216,00	432,00
			"Z11c,Z11d" 1+1		2,000		
32	404	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000	165,00	330,00
			"Z11c,Z11d" 1+1		2,000		
33	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	190,00	1 330,00
			"C9a" 2		2,000		
			"C9b" 2		2,000		
			"B1" 1		1,000		
			"A19" 1		1,000		
			"E13" 1		1,000		
			Součet		7,000		
34	404	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
			"E13" 1		1,000		
35	404	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	6,000	890,00	5 340,00
			"C9a" 3		3,000		
			"C9b" 2		2,000		
			"B1" 1		1,000		
			Součet		6,000		
36	404	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
			"A19" 1		1,000		
37	404	404442710	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	4,000	4 800,00	19 200,00
			"IP22" 2+2		4,000		
38	404	404452410R	patka pro DZ přenosná	kus	8,000	512,00	4 096,00
39	221	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	295,00	1 180,00
			"IP22" 2+2		4,000		
40	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	11,000	700,00	7 700,00
41	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	11,000	490,00	5 390,00
42	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	230,00	4 370,00
43	592	592174110	obrubník betonový 100x8x25 cm	kus	19,190	97,00	1 861,43
			19*1.01		19,190		
44	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	6,000	230,00	1 380,00
45	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	6,000	85,00	510,00
46	011	953945145R	Kotva do betonu a ocel. objímka pro sloupek vč.šroubů	kus	26,000	496,00	12 896,00

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Právobřežní vltavská cyklostezka ČB-Hluboká n.Vlt.

Objekt: Část J, K

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
47	221	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	14,000	620,00	8 680,00
48	221	979082219	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	260,640	37,00	9 643,68
			24*10.86		260,640		
49	221	979084216	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	0,350	37,00	12,95
50	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	1,400	25,00	35,00
			4*0.35		1,400		
51	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 938,454	150,00	290 768,10
			1076.919*1.8		1 938,454		
		99	Přesun hmot				146 592,43
52	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinovým	t	2 124,528	69,00	146 592,43
			<u>Celkem</u>				<u>2 664 493,91</u>

Stavba: Pravobřežní vltavská cyklostezka ČB-Hluboká n.Vlt.
Objekt: DIO část J, K

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena žadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV
-----	---------------------

8 053.06

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 050,00

1	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	190,00	1 140,00
			"B1" 2		2,000		
			"Z2" 2		2,000		
			"E13" 2		2,000		
			Součet		6,000		
2	404	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	2,000	890,00	1 780,00
			"B1" 2		2,000		
3	404	404443170	značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00
			"E13" 2		2,000		
4	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	490,00	1 960,00
5	404	404443380	značka svislá reflexní AL- NK	kus	2,000	840,00	1 680,00
			"Z2" 2		2,000		
6	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	65,00	390,00

99 Přesun hmot

3.06

7	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytým živičným	t	0,047	65,00	3,06
---	-----	-----------	--	---	-------	-------	------

Celkem

8 053.06

VÝKAZEM VÝMĚR

avobřežní vltavská cyklostezka ČB-Hluboká n.Vlt.

Část M

Datum:

..KSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 142 363,49

1 Zemní práce

162 468,50

1	469	111311000R	Sejmutí drnu a dočištění na stáv. podklad	m2	940,000	65,00	61 100,00
2	469	131215940R	Hloubení nezapažených jam základů sloupků	kus	197,000	340,00	66 980,00
			"základ pro dř. zábradlí" 383/2+1.5		193,000		
			"základ pro ocel. zábradlí" 4		4,000		
			Součet		197,000		
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	432,00	2 592,00
			1.5*1*4		6,000		
4	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,000	25,00	150,00
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,000	60,00	360,00
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	53,000	245,00	12 985,00
			"rýha" 6		6,000		
			"sejmutí drnu" 940*0.05		47,000		
			Součet		53,000		
7	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	795,000	19,50	15 502,50
			53*15		795,000		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	53,000	12,00	636,00
9	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,800	120,00	216,00
			6*0.5*0.6		1,800		
10	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,700	310,00	837,00
			6*0.6*0.75		2,700		
11	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	60,000	18,50	1 110,00

16 138,24

2 Zakládání

12	211	275311123	Základové patky z betonu prostého C 8/10	m3	6,304	2 560,00	16 138,24
			197*0.2*0.2*0.8		6,304		

3 Svislé a kompletní konstrukce

720,00

275 760,00

13	211	348181111	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé vč.impregnace	m	383,000	720,00	275 760,00
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------------

4 Vodorovné konstrukce

612,00

14	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,900	680,00	612,00
			6*0.6*0.25		0,900		

5 Komunikace

167 922,00

15	221	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	982,000	29,00	28 478,00
16	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	982,000	142,00	139 444,00
			892+90		982,000		

8 Trubní vedení

9 584,00

17	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	6,000	12,50	75,00
18	286	286112630R	Trubka PVC SN8 DN 150 dl.2 m	kus	3,000	520,00	1 560,00
19	271	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	39,00	39,00
20	286	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	1,000	270,00	270,00

ANÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Pravobřežní vltavská cyklostezka ČB-Hluboká n.Vlt.

Objekt: Část M

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
21	271	895941211R	Zřízení vpustí dvorní z betonových dílců	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
22	562	562311770R	vpust' dvorní	kus	1,000	5 630,00	5 630,00
23	271	8999R	Obetonování výústí přípojky UV	kus	1,000	860,00	860,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							491 186,99
24	R	900	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
25	R	901	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
26	221	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	2,000	460,00	920,00
27	592	592163650	zábradlí ocelové 2 x1 m	m	2,000	3 600,00	7 200,00
28	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	168,00	672,00
			"C8a" 2		2,000		
			"C14a" 1		1,000		
			"C8b" 1		1,000		
			Součet		4,000		
29	404	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00
			"C8a" 2		2,000		
			"C8b" 1		1,000		
			"C14a" 1		1,000		
			Součet		4,000		
30	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	700,00	4 900,00
31	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,000	490,00	3 430,00
32	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	767,000	230,00	176 410,00
33	592	592174110	obrubník betonový 100x8x25 cm	kus	774,670	97,00	75 142,99
			767*1.01		774,670		
34	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	6,000	230,00	1 380,00
35	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	6,000	185,00	1 110,00
36	011	953945145R	Kotva do betonu a ocel. objímka pro sloupek, vč šroubů	kus	193,000	496,00	95 728,00
37	221	979071111R	Očištění kamenného povrchu tlakovou vodou	m2	982,000	12,00	11 784,00
38	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	95,400	150,00	14 310,00
			53*1.8		95,400		
99 Přesun hmot							18 691,76
39	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	270,895	69,00	18 691,76

Celkem

1 142 363,49

S VÝKAZEM VÝMĚR

Pravobřežní vltavská cyklostezka ČB-Hluboká n.Vlt.

DIO část M

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

13 690,27

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 685,00

1	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	190,00	1 710,00
			"B1" 4		4,000		
			"Z2" 4		4,000		
			"E13" 1		1,000		
			Součet		9,000		
2	404	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus	4,000	890,00	3 560,00
			"B1" 4		4,000		
3	404	404443170	značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm	kus	1,000	550,00	550,00
			"E13" 1		1,000		
4	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	490,00	3 920,00
5	404	404443380	značka svislá reflexní AL- NK	kus	4,000	840,00	3 360,00
			"Z2" 4		4,000		
6	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000	65,00	585,00
99 Přesun hmot							5,27
7	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živčným	t	0,081	65,00	5,27

Celkem

13 690,27

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 26.9.2012 uzavřené mezi objednatelem: **Město Hluboká nad Vltavou**, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupené starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.**, Čechova 625/26, 370 04 České Budějovice, IČ: 26076748, zastoupená jednatelem společnosti, panem Patrikem Pilátem, ve věci realizace díla: **PRAVOBŘEŽNÍ VLTAVSKÁ CYKLOSTEZKA ČESKÉ BUDĚJOVICE – HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ÚSEKY J, K, M.**

- I. Smluvní strany – se nemění.
- II. Předmět plnění – se nemění.
- III. Změny díla – se nemění.
- IV. Doba plnění – se nemění.
- V. Cena díla – se nemění.
- VI. Fakturace a plnění – se nemění.
- VII. Provádění díla – se nemění.
- VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.
- IX. Záruka na dílo – se nemění.
- X. Smluvní pokuty – se nemění.
- XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.
- XII. Závěrečná ustanovení – se doplňuje na základě požadavku Státního fondu dopravní infrastruktury a na základě dohody smluvních stran takto:
 - XII.6. Státní fond dopravní infrastruktury má právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
 - XII.7. V případě, že bude stavba z důvodu potíží při financování díla pozastavena, dojde na základě dohody smluvních stran ke stanovení rozsahu prací, nezbytných pro dokončení ucelené části díla. Provedené práce budou vyčísleny dle skutečnosti v jednotkových cenách položkového rozpočtu z nabídky a vyúčtovány. V takovém

případě si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy s tím, že zhotoviteli v souvislosti s tímto odstoupením nevznikne nárok na zaplacení jakýkoliv smluvních sankcí či náhradu škody.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo se nemění.

Hluboká nad Vltavou dne 26.9.2012

České Budějovice dne 26.9.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města



Patrik Pilát

jednatel společnosti

A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.

Čečova 625/26

370 04 České Budějovice

tel./fax: 386 353 142

IČ: 260 76 748, DIČ: CZ26076748
