

# Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

## Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Obec Dolní Město**  
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město  
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce  
IČ: 00267376  
DIČ:  
Telefon, fax: +420 569 487 121  
E-mail: [ou.dolnimesto@seznam.cz](mailto:ou.dolnimesto@seznam.cz)  
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce  
Osoba odpovědná ve věcech technických: - starosta obce - Pavel Chlád

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **EUROVIA CS,a.s.**  
Sídlo: **Národní 138/10,110,00 Praha 1**  
Zastoupení: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1005845621/0100  
Telefon, fax: +420 547 428 811/+420 547 428 800  
E-mail: [eurovia-morava.jih@eurovia.cz](mailto:eurovia-morava.jih@eurovia.cz)  
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih  
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel David, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen Zhotovitel)

## Článek 2. – Předmět plnění

- 1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení stavby „**OPRAVA KOMUNIKACÍ V DOLNÍM MĚSTĚ, LOKALITA NA DRÁŽKÁCH**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných

materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 2) Jedná se o opravu komunikací v obci a k.ú Dolní Město
- 3) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.
- 4) Stručný popis plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikací v Dolním Městě v lokalitě Na Drázkách v rozsahu vyznačeném v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 5) Množství a rozsah zakázky:

Přesný rozsah prací je podrobně vymezen v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy – položkovém rozpočtu stavby.

### Článek 3. – Cena díla

- 1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena celkem bez DPH:	690 412,29Kč
<u>DPH ve výši 21 %</u>	<u>144 986,58Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>835 398,87Kč</b>

*(Slovy: osmsetřicetpěttisíctřístadevadesátosmcelýchosmdesátsedmKč včetně DPH)*

*Stavba je členěna na 5 stavebních objektů : SO 01 Část A – spodní Drážka, SO 01 odv Odvodnění - Část A – spodní Drážka, SO 02 Část B – propojení spodních a horních Drážek, SO 03 Část C -horní Drážka, SO 03 odv Odvodnění - Část C - horní Drážka. Ceny jednotlivých uvedených objektů jsou samostatně uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – položkovém rozpočtu stavby.*

- 2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy, zejména náklady také na:
  - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
  - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - opatření k ochraně životního prostředí,
  - pojištění stavby a osob,
  - organizační, koordinační a kompletační činnost,
  - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
  - zajištění nezbytných dopravních opatření.
- 3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 18 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.
- 4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.

- 5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:
- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
  - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
  - pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
  - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
  - pokud se v průběhu platnosti Smlouvy vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl objektivně předvídat a tyto skutečnosti nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele, brání či zjevně ztěžují řádné splnění jeho povinností, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tyto skutečnosti nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 7) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 8) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 9) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 10) Změna ceny díla je možná pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.

#### Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění: **15.9.2017**

Ukončení plnění nejpozději do: **27.10.2017**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 30 dnů), neposouvá se tak i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává nezměněna.

- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
- 3) Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
- 5) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 6) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatel. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

#### **Článek 5. – Záruka za dílo**

- 1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce **36** měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.
- 2) Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.
- 3) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může je odstranit objednatel prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

#### **Článek 6. - Předání a převzetí díla**

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.

- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
  - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášeních o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
- 4) O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
  - a) seznam předaných dokladů,
  - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků bránících a nebránících řádnému užívání díla včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
  - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - e) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

#### **Článek 7.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

- 1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
  - a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
  - b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých termínech ve výši 1.500 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
  - c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 1.500 Kč za každý takový případ,
  - d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení.
- 2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto článku může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
- 4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou oprávněně a správně vystavených faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

### **Článek 8. – Platební podmínky**

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Příslušná platba se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem na základě soupisu provedených prací, odsouhlaseného odpovědným zástupcem Objednatele.
- 2) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad (faktura) bude vystaven Zhotovitelem po dokončení a předání stavby do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací.
- 3) Splatnost faktur je 15 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

### **Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď**

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
  - a) by zhotovitel překročil termín realizace díla o více jak 30 dnů,
  - b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti faktury.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

### **Článek 10. – Zvláštní ustanovení**

- 1) Ustanovení této smlouvy, zejména článků 2., 3., 4. a 7. může být upraveno s ohledem na skutečný průběh financování výstavby. Takové úpravy budou předmětem dodatku k této smlouvě, jakmile taková skutečnost vyjde najevo, a to na základě podnětu vzešlého ze strany Objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.
- 3) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4) Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že umožní Objednateli zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 5) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Zhotovitel je na písemnou výzvu objednatelů povinen mu neprodleně předložit platnou pojistnou smlouvu včetně dokladu o zaplacení pojistného, a to ke dni výzvy objednatelů.

- 6) Zhotovitel se zavazuje min. 50 % finančního objemu předmětu plnění realizovat vlastními kapacitami a max. 50 % prostřednictvím subdodavatelů.
- 7) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 8) Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat tak, aby nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

### **Článek 11. – Společná a závěrečná ustanovení**

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 3) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
  - ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
  - ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
  - ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
  - ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
  - ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy,
  - ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkající se právní domněnky, dle níž je-li kvittance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.
- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 5) Zhotovitel si je vědom toho, že realizace díla či jeho části, které je předmětem této smlouvy, může být částečně financována z Programu obnovy venkova Vysočiny. Zhotovitel si je vědom toho, že nebude-li dílo zhotoveno řádně a včas, může objednateli způsobit také škody spočívající ve ztrátě spolufinancování z Programu obnovy venkova Vysočiny.
- 6) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 8) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 9) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
- 10) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


11) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1. – Zákres komunikací do KN

Příloha č. 2. - Krycí list rozpočtu a Podrobný položkový rozpočet

V Dolním Městě, dne 30.3.2017


Za Objednatele:



Pavel Chlád, starosta obce


V Brně, dne 24.3.2017

Za Zhotovitele:



Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu  
Morava jih



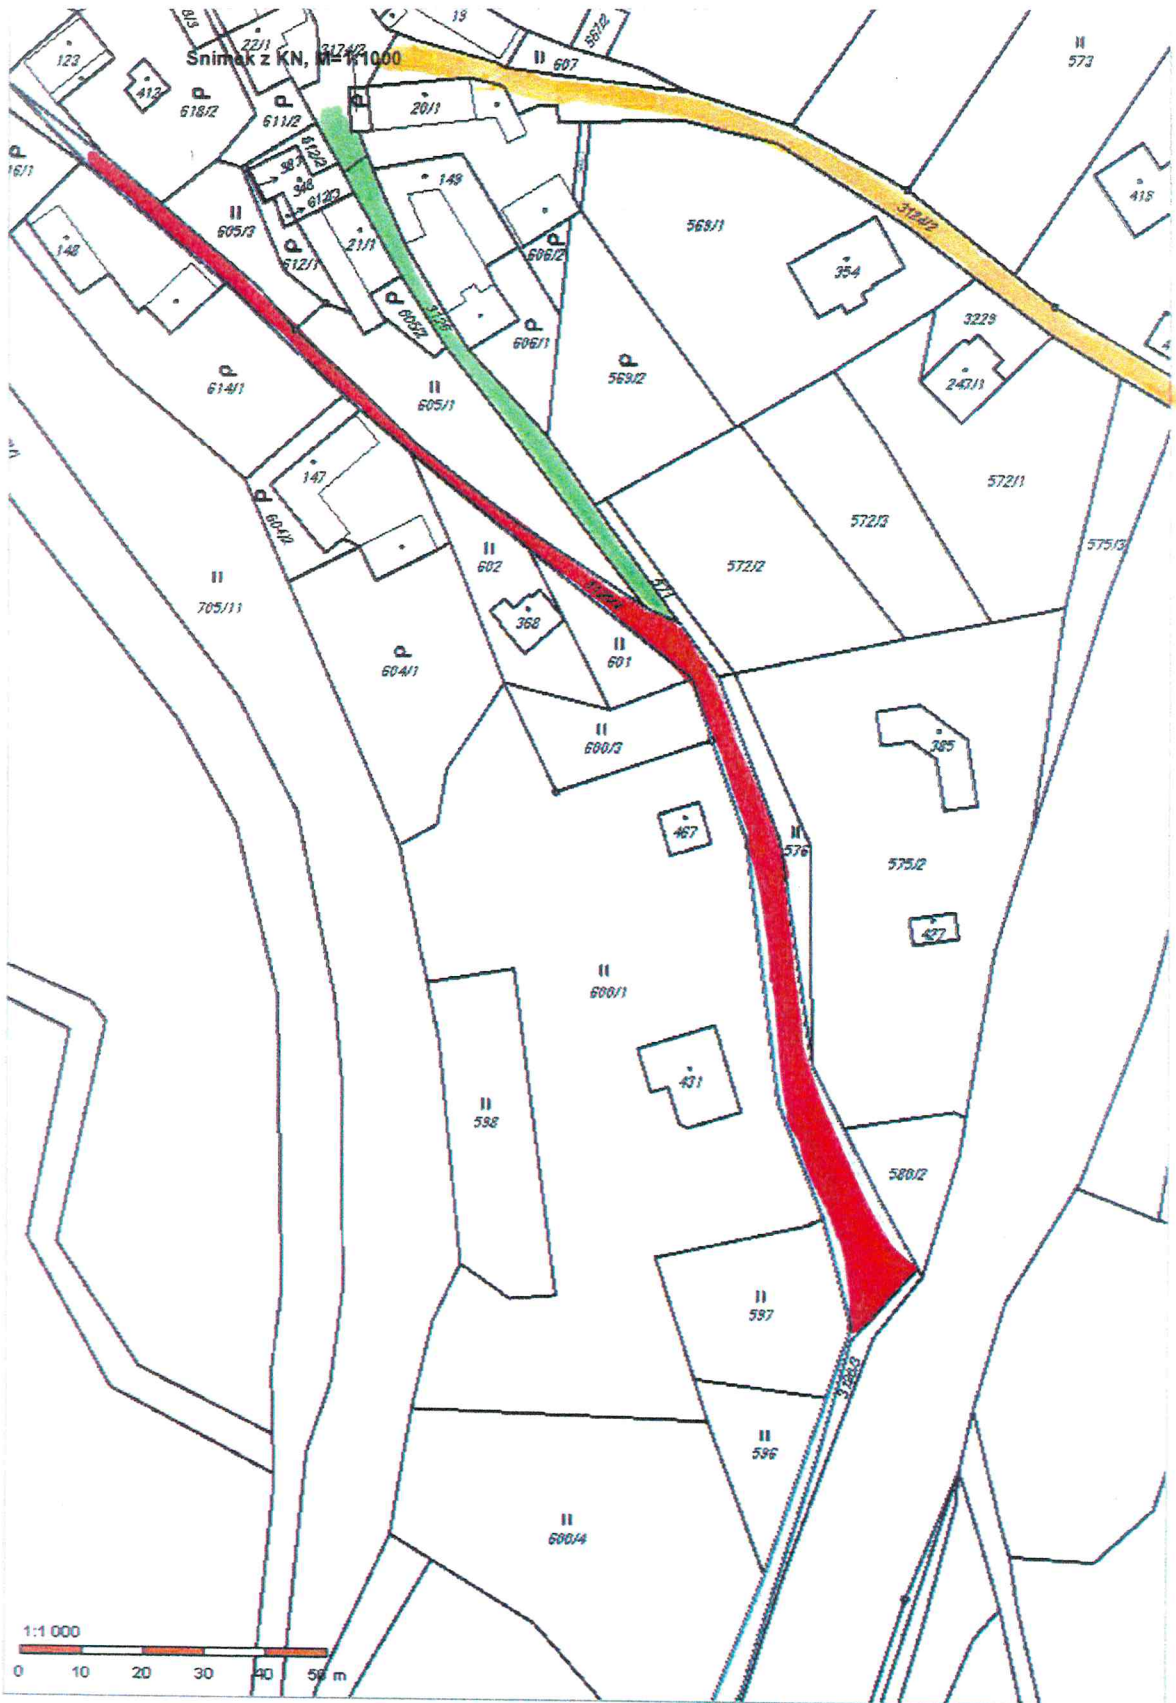

- ČAST A
- ČAST B
- ČAST C

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 318

**Stavba:** Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drážkách

KSO: Dolní Město

CC-CZ: 3.3.2017  
Datum:

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

IČ: 00267376  
DIČ: CZ00267376

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**690 412,29**

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**690 412,29**  
0,00

Výše daně  
144 986,58  
0,00

DPH základní  
snižena

**Cena s DPH**

**V CZK**

**835 398,87**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 318

**Stavba:** Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drážkách

Místo: Dolní Město

Datum: 03.03.2017

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 01	Část A - spodní Drážka	<b>690 412,29</b>	<b>835 398,87</b>	
SO 01 odv	Odvodnění - Část A - spodní Drážka	199 271,26	241 118,22	STA
SO 02	Část B - popojení spodních a horních Drážek	38 344,82	46 397,23	STA
SO 03	Část C - horní Drážka	155 545,34	188 209,86	STA
SO 03 odv	Odvodnění - Část C - horní Drážka	218 864,99	264 826,64	STA
		78 385,88	94 846,91	STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Dražkách

Objekt:

## SO 01 - Část A - spodní Dražka

KSO:

Místo: Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ:

00267376

DIČ:

CZ00267376

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
199 271,26  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
41 846,96  
0,00

**199 271,26**

**Cena s DPH**

**v CZK**

**241 118,22**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drážkách

Objekt:

**SO 01 - Část A - spodní Drážka**

Místo:

Dolní Město

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

199 271,26

199 271,26

186 783,63

7 123,72

5 363,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drázkách

Objekt:

## SO 01 - Část A - spodní Drážka

Místo:

Dolní Město

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

199 271,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

199 271,26

D 5

Komunikace pozemní

186 783,63

1

K 1

Vyrovnání a zesílení stávajícího podkladu obalovanou asfaltovou směsí ACO 11

t

32,390

1 753,36

56 791,33

PP

Vyrovnání a zesílení stávajícího podkladu obalovanou asfaltovou směsí ACO 11

2

K 57714411

Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2

672,000

191,75

128 856,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

3

K 2

Oprava pracovních spar profrézováním komůrky 12/20 mm a zalitím asfaltovou zálivkou BIGUMA

m

11,000

103,30

1 136,30

PP

Oprava pracovních spar profrézováním komůrky 12/20 mm a zalitím asfaltovou zálivkou BIGUMA

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 123,72

4

K 919735111

Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm, se zabouráním při napojení na stávající úpravu

m

4,000

51,65

206,60 CS ÚRS 2017 01

PP

Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm, se zabouráním při napojení na stávající úpravu

5

K 919735112

Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm

m

8,000

103,30

826,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

6

K 938909311

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného

m2

672,000

5,17

3 474,24 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
7	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	72,000	36,34	2 616,48	CS ÚRS 2017 01
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
D		997	<b>Přesun sutě</b>				5 363,91	
8	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodornou dopravu	t	9,072	101,11	917,27	CS ÚRS 2017 01
PP			Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodornou dopravu sutí					
9	K	997321511	Vodorná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	9,072	489,12	4 437,30	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
10	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	9,072	1,03	9,34	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost. Příplatek k cenám za každý další i započítá 1 km přes 1 km					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drážkách

Objekt:

## SO 01 odv - Odvodnění - Část A - spodní Drážka

KSO:

Místo: Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ: 00267376

DIČ: CZ00267376

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**38 344,82**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
38 344,82  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
8 052,41  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 397,23**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drážkách

Objekt:

**SO 01 odv - Odvodnění - Část A - spodní Drážka**

Místo:

Dolní Město

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**38 344,82**

**38 344,82**

10 058,31

2 617,10

5 413,00

20 256,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drázkách

Objekt:

## SO 01 odv - Odvodnění - Část A - spodní Drážka

Místo: Dolní Město

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs  
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 03.03.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>38 344,82</b>	
D	1		Zemní práce				<b>38 344,82</b>	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,640	221,06	1 909,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				10 058,31	
2	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	1,080	797,48	861,28	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
3	K	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	1,080	1 533,61	1 656,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství					
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,640	489,12	1 291,28	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
5	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,160	489,12	1 056,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,640	91,01	240,27	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4					
7	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,160	101,11	218,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 5 až 7					
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	6,000	101,93	611,58	CS ÚRS 2017 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m <sup>3</sup>	3,600	191,11	688,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
10	M	583373020	<b>šterkopisek frakce 0-16</b>	t	7,200	211,77	1 524,74	CS ÚRS 2017 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) šterkopiský ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				2 617,10	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m <sup>3</sup>	1,200	555,75	666,90	CS ÚRS 2017 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
12	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m <sup>3</sup>	0,500	1 456,90	728,45	CS ÚRS 2017 01
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného, netříděného					
13	K	463451112	Protiti kamenné rovnaniny maltou MC 10	m <sup>3</sup>	0,500	2 443,49	1 221,75	CS ÚRS 2017 01
PP			Protiti konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-10					
D	8		<b>Trubní vedení</b>				5 413,00	
14	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	20,000	270,65	5 413,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				20 256,41	
15	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštěm můstkovým z litiny	m	4,000	4 232,02	16 928,08	CS ÚRS 2017 01
PP			Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštěm můstkovým z litiny					
16	K	935932614	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm	kus	1,000	3 328,33	3 328,33	CS ÚRS 2017 01
PP			Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drážkách

Objekt:

**SO 02 - Část B - popojení spodních a horních Drážek**

KSO:

Místo: Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ:

00267376

DIČ:

CZ00267376

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**155 545,34**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
155 545,34  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
32 664,52  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**188 209,86**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drážkách

Objekt:

**SO 02 - Část B - popojení spodních a horních Drážek**

Místo:

Dolní Město

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

12 546,27

5 - Komunikace pozemní

122 900,77

8 - Trubní vedení

7 462,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 142,76

997 - Přesun sutě

8 492,85

**155 545,34**

**155 545,34**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drázkách

Objekt:

## SO 02 - Část B - popojení spodních a horních Drážek

Místo: Dolní Město

Datum: 03.03.2017

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**155 545,34**

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

155 545,34

12 546,27

1

K 1

Strojní rozrušení stávající úpravy s přerovnáním, zapískováním a přehutněním

m2

319,000

39,33

12 546,27

D 5

Komunikace pozemní

122 900,77

2 K 2

Dodávka a montáž kameniva drčeného hrubého, ŠD 0-32 mm

t

17,106

284,08

4 859,47

PP

Dodávka a montáž kameniva drčeného hrubého, ŠD 0-32 mm

3 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2

615,600

191,75

118 041,30 CS ÚRS 2017 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

D 8

Trubní vedení

7 462,69

4 K 899331111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

kus

1,000

3 212,63

3 212,63 CS ÚRS 2017 01

PP

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

5 K 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus

2,000

2 125,03

4 250,06 CS ÚRS 2017 01

PP

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 142,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	114,000	36,34	4 142,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
D	997		<b>Přesun sutě</b>				8 492,85	
7	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,364	101,11	1 452,34	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
8	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	14,364	489,12	7 025,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
9	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	14,364	1,03	14,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava komunikaci v Dolním Městě, lokalita Na Dražkách

Objekt:

## SO 03 - Část C - horní Dražka

KSO:

Místo: Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měš

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ:

00267376

DIČ:

CZ00267376

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**218 864,99**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
218 864,99  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
45 961,65  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**264 826,64**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Dražkách

Objekt:

**SO 03 - Část C - horní Dražka**

Místo:

Dolní Město

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a. s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

**218 864,99**

1 - Zemní práce

17 934,48

5 - Komunikace pozemní

180 665,93

8 - Trubní vedení

7 462,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 301,34

997 - Přesun sutě

8 500,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Drázkách

Objekt:

## SO 03 - Část C - horní Drážka

Místo:

Dolní Město

Datum: 03.03.2017

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**218 864,99**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**218 864,99**

D 1

Zemní práce

17 934,48

1

K 1

Strojní rozrušení stávající úpravy s přerovnáním, zapiskováním a přehutněním

39,33

17 934,48

PP

Strojní rozrušení stávající úpravy s přerovnáním, zapiskováním a přehutněním

39,33

D 5

Komunikace pozemní

180 665,93

2

K 2

Oprava pracovních spar profrézováním komůrky 12/20 mm a zalitím asfaltovou zálivkou BIGUMA

103,30

309,90

PP

Oprava pracovních spar profrézováním komůrky 12/20 mm a zalitím asfaltovou zálivkou BIGUMA

103,30

3

K 3

Dodávka a montáž kameniva drčeného hrubého, ŠD 0-32 mm

284,08

11 577,68

PP

Dodávka a montáž kameniva drčeného hrubého, ŠD 0-32 mm

284,08

4

K 57714411

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

191,75

168 778,35 CS ÚRS 2017 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm

191,75

D 8

Trubní vedení

7 462,69

5

K 89933111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

3 212,63

3 212,63 CS ÚRS 2017 01

PP

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

3 212,63

6

K 89943111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

2 125,03

4 250,06 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				4 301,34	
7	K	919735111	Řezání stávajícího živичního krytu hl do 50 mm, se zabouráním při napojení na stávající úpravu	m	3,000	51,65	154,95 CS ÚRS 2017 01	
PP			Řezání stávajícího živичního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm, se zabouráním při napojení na stávající úpravu					
8	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	114,100	36,34	4 146,39 CS ÚRS 2017 01	
PP			Čištění krajnic odstaněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
D	997		<b>Přesun sutě</b>				8 500,55	
9	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,377	101,11	1 453,66 CS ÚRS 2017 01	
PP			Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
10	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	14,377	489,12	7 032,08 CS ÚRS 2017 01	
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
11	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	14,377	1,03	14,81 CS ÚRS 2017 01	
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Dražkách

Objekt:

**SO 03 odv - Odvodnění - Část C - horní Dražka**

KSO:

Místo: Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

IČ: 00267376

DIČ: CZ00267376

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**78 385,88**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
78 385,88  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
16 461,03  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**94 846,91**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací v Dolním Městě, lokalita Na Dráždkách

Objekt:

**SO 03 odv - Odvodnění - Část C - horní Drážka**

Místo:

Dolní Město

Zadavatel:

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Datum:

03.03.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**78 385,88**

**78 385,88**

37 220,43

5 623,22

17 401,83

18 140,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikaci v Dolním Městě, lokalita Na Drázkách

Objekt:

## SO 03 odv - Odvodnění - Část C - horní Drážka

Místo: Dolní Město

Datum: 03.03.2017

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**78 385,88**

D HSV

### Práce a dodávky HSV

**78 385,88**

D 1

### Zemní práce

**37 220,43**

1 K 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

4 111,72 CS ÚRS 2017 01

PP

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

2 K 132401101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5

2 472,19 CS ÚRS 2017 01

PP

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

3 K 132501101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6

4 754,19 CS ÚRS 2017 01

PP

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství

4 K 162401102

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

9 097,63 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

5 K 162401152

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7

3 032,54 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

6 K 167101101

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

1 692,79 CS ÚRS 2017 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4					
	pp		Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,200	101,11	626,88 CS ÚRS 2017 01	
8	K	175151101	Obsypání potrubí a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 5 až 7					
	pp		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m <sup>3</sup>	18,600	191,11	3 554,65 CS ÚRS 2017 01	
9	M	583373020	šterkopišek frakce 0-16	t	37,200	211,77	7 877,84 CS ÚRS 2017 01	
	pp		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopišsky) šterkopišsky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného					
	pp		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m <sup>3</sup>	3,100	555,75	5 623,22	1 722,83 CS ÚRS 2017 01
11	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného					
	pp		Rovnanina z lomového kamene neupraveného, netříděného	m <sup>3</sup>	1,000	1 456,90	1 456,90 CS ÚRS 2017 01	
12	K	463451112	Protlití kamenné rovnaniny maltou MC 10					
	pp		Protlití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-10	m <sup>3</sup>	1,000	2 443,49	2 443,49 CS ÚRS 2017 01	
D	8		<b>Trubní vedení</b>					
13	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150					
	pp		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150	m	62,000	270,65	17 401,83	16 780,30 CS ÚRS 2017 01
14	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150					
	pp		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	3,000	144,62	433,86 CS ÚRS 2017 01	
15	M	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15					
	pp		koleno kanalizace plastové KG 150x15	kus	1,015	58,88	59,76 CS ÚRS 2017 01	
16	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45					
	pp		koleno kanalizace plastové KG 150x45	kus	2,030	63,01	127,91 CS ÚRS 2017 01	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
							18 140,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	m	3,500	4 232,02	14 812,07	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny					
18	K	935932614	Vpust' s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm	kus	1,000	3 328,33	3 328,33	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm					
